


Remodelación "ESTRELLA 5"

San José del Cabo, La Jolla, B.C.S.

18/07/22 - 23/07/22

Trabajos preliminares: Se realizo el movimiento de muebles y protección de áreas (Recamara master y lock off).




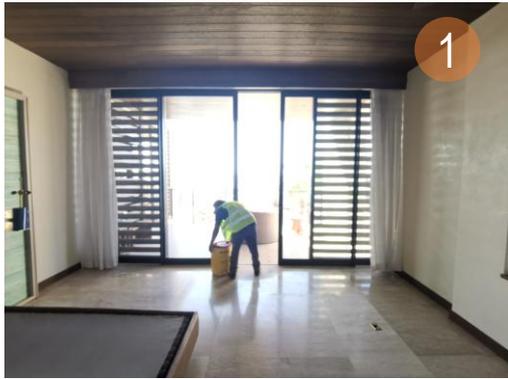


Remodelación "ESTRELLA 5"

San José del Cabo, La Jolla, B.C.S.

18/07/22 - 23/07/22

Trabajos eléctricos: Se desmontaron lámparas de plafón, lampara de muro, contactos, apagadores, cintilla luminosa y abanicos.

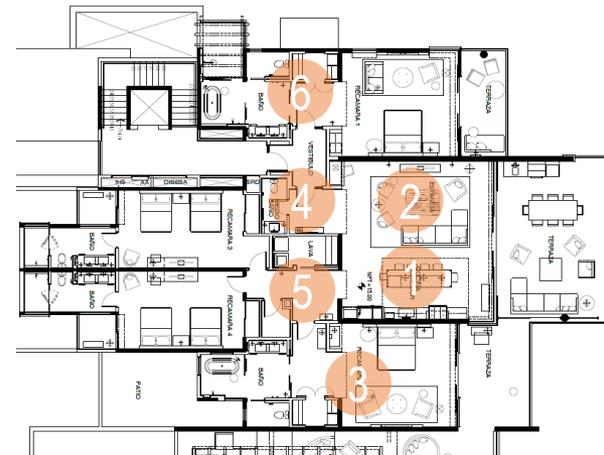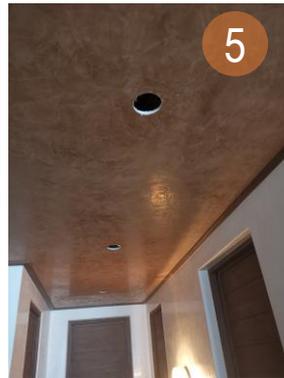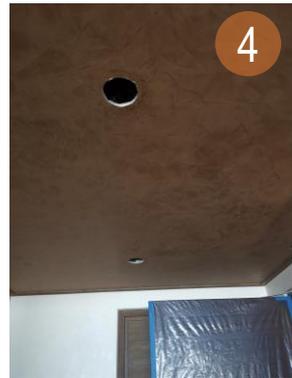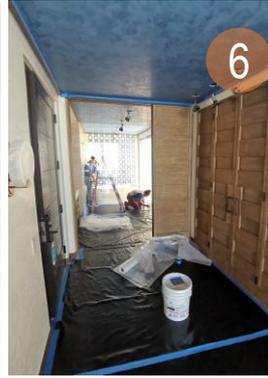

Remodelación "ESTRELLA 5"

San José del Cabo, La Jolla, B.C.S.

18/07/22 - 23/07/22

Arte: Se desmontaron las piezas de arte y se resguardaron.




Remodelación “ESTRELLA 5”

San José del Cabo, La Jolla, B.C.S.

18/07/22 - 23/07/22

Recamara master: Se empezó a preparar el plafón de duelas madera para recibir pintura blanca. (Protección, resane y lijado).

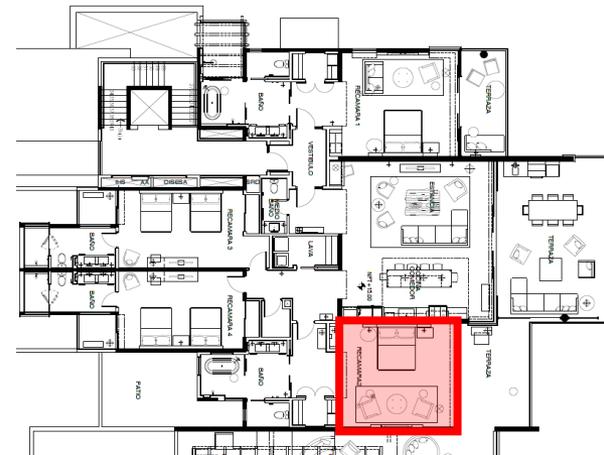


Remodelación "ESTRELLA 5"

San José del Cabo, La Jolla, B.C.S.

18/07/22 - 23/07/22

Baños y vestíbulo Lock-off: Se empezó a preparar el plafón para recibir acabado en paladio blanco. (Aplicación de covermix).

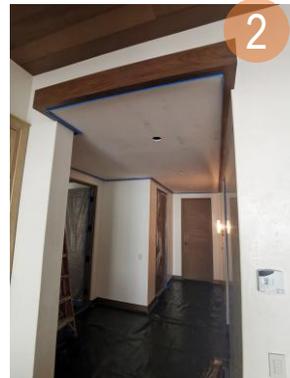

Remodelación "ESTRELLA 5"

Chileno Bay, B.C.S.

25/07/22 - 30/07/22

Trabajos preliminares: Se realizo el movimiento de muebles y protección de áreas (Recamara lock off, gran salón y cocina).



Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, B.C.S.

25/07/22 - 30/07/22

Recamara lock-off: Se empezó a preparar el plafón de duelas madera para recibir pintura blanca. (resane y lijado).




Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, B.C.S.

25/07/22 - 30/07/22

Recamara gran salón: Se empezó a preparar el plafón de duelas madera para recibir pintura blanca. (resane y lijado).

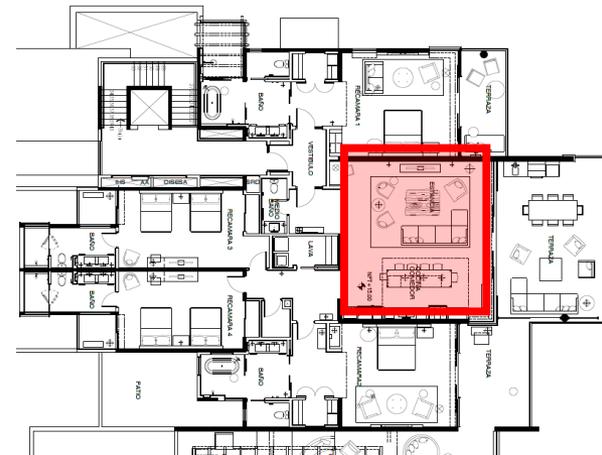


Remodelación "ESTRELLA 5"

Chileno Bay, B.C.S.

25/07/22 - 30/07/22

Acabado paladio en plafón: Se aplico paladio en vestíbulos de acceso principal y acceso a recamaras

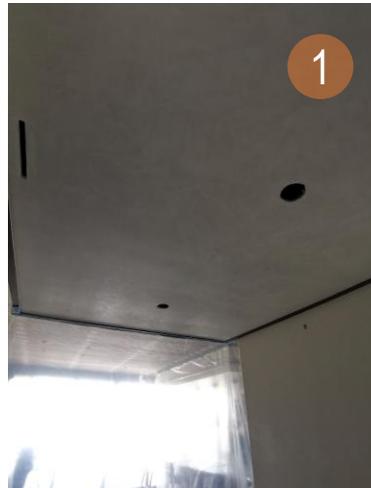


Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

01/08/22 - 06/08/22

Recamara gran salón: Se termino de preparar el plafón de duelas madera para recibir pintura blanca. (resane y lijado).

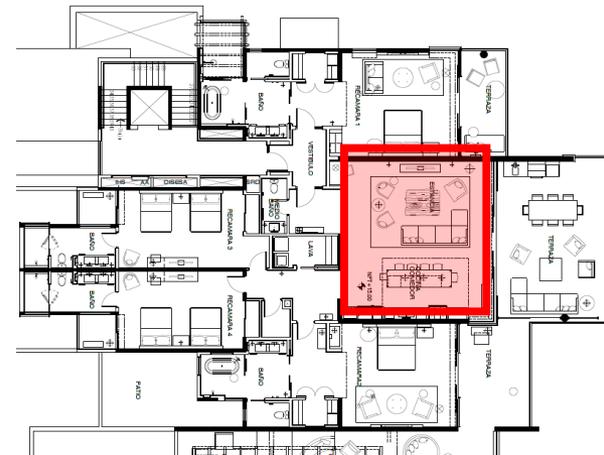


Remodelación "ESTRELLA 5"

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

01/08/22 - 06/08/22

Medio baño: Se desinstalo wc, se protegió el área y se empezó a preparar muro con cement tile, para recibir papel tapiz

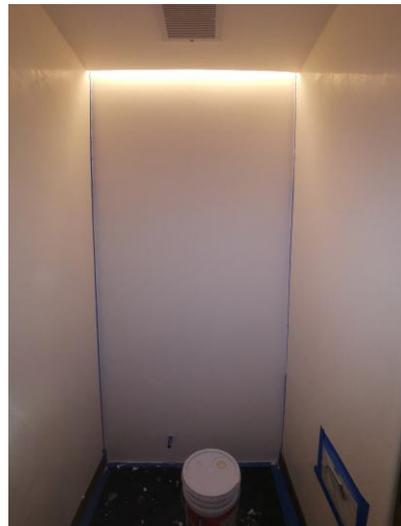

Remodelación "ESTRELLA 5"

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

01/08/22 - 06/08/22

Cocina: Se desinstalo campana, estufa, llave mezcladora de tarja, triturador y carpintería.





Remodelación "ESTRELLA 5"

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

01/08/22 - 06/08/22

Vestíbulo recamaras: Se abrió plafón para dejar preparación eléctrica para la nueva instalación de candelabro.

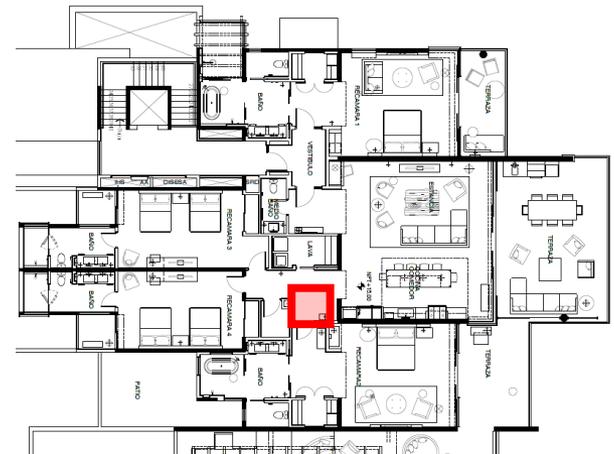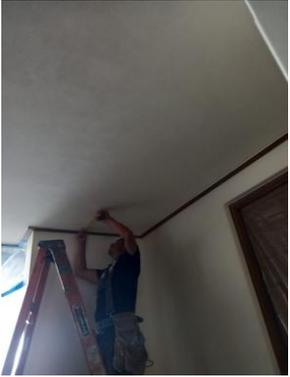


Remodelación "ESTRELLA 5"

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

01/08/22 - 06/08/22

Baño y vestíbulo Lock-off: Se aplico acabado final (Paladio blanco).

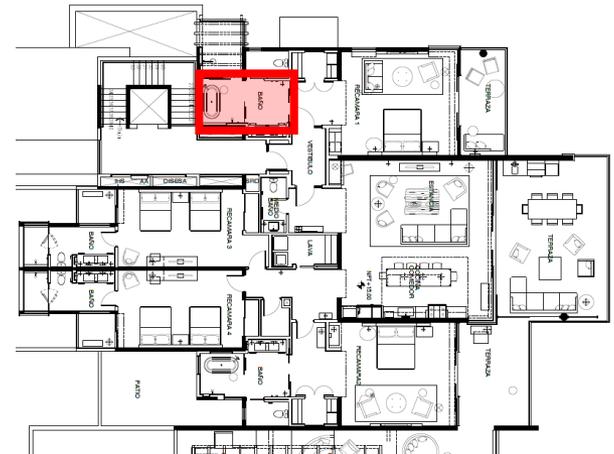


Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

08/08/22 - 14/08/22

Recamara gran salón: Se continua con el proceso para pintara plafón, se sello la superficie, se aplico primer, se pasteo y se volvió a aplicar primer.

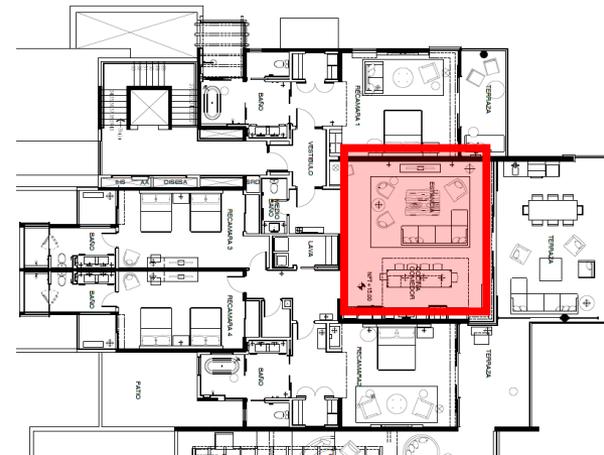

Remodelación "ESTRELLA 5"

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

08/08/22 - 14/08/22

Recamara lock-off: Se continua con el proceso para pintara plafón, se sello la superficie, se aplico primer, se pasteo y se volvió a aplicar primer.



Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

08/08/22 - 14/08/22

Recamara master: Se realizo el ajuste del faldón y se fabricaron dos cajillos extras para lograr obscuridad total.




Remodelación "ESTRELLA 5"

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

08/08/22 - 14/08/22

Cocina: Se retiro el backsplash y cubiertas.

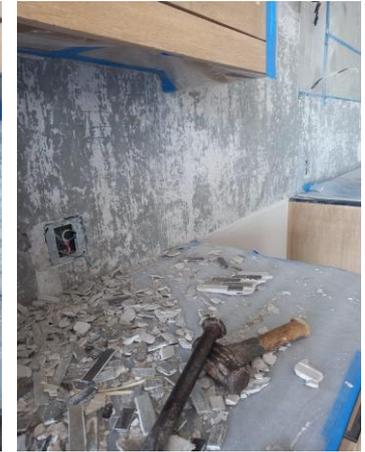

Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

08/08/22 - 14/08/22

Cocina: Se comenzó a realizar los ajuste en la carpintería.



Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

08/08/22 - 14/08/22

Vestíbulo recamaras: Se detallo muro por retiro de arte (mariposas), tapo y detalle hueco por retiro de sonce , se tapo hueco en plafón y se detallo. (Acabado paladio).





Remodelación "ESTRELLA 5"

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

08/08/22 - 14/08/22

Demoliciones: -En recamara 3 y 4 se realizaron ranuras para periscopio y se realizaron nichos para el movimiento de las televisiones.

- En gran salón se realizaron ranuras para mover contacto y accesorio de voz y datos para lo que será el nuevo bar.

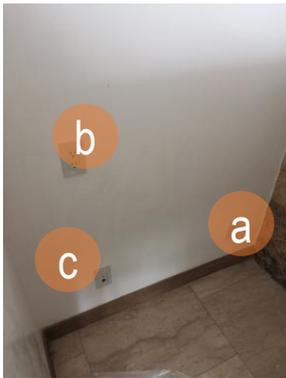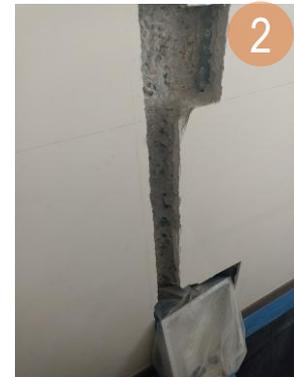

Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

15/08/22 - 21/08/22

Rec. Lock-off: Se termino el proceso de pintura de duelas de madera y se instalaron lámparas y abanico con nuevo color.




Remodelación "ESTRELLA 5"

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

15/08/22 - 21/08/22

Rec. Lock-off: Se empezó limpieza fina; se detallo muros y plafones de paladio.

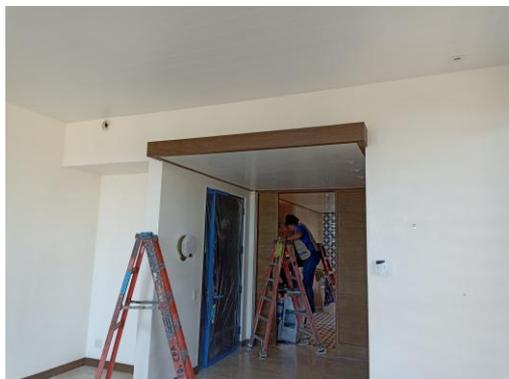


Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

15/08/22 - 21/08/22

Gran Salón: Se continua el proceso de pintura de duelas de madera y se empezó a detallar muros de bar seco.

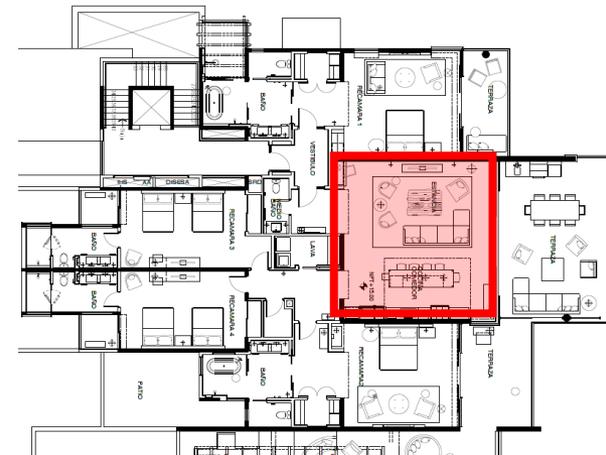


Remodelación "ESTRELLA 5"

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

15/08/22 - 21/08/22

Cocina: Se avanzo en el proceso de modificación.

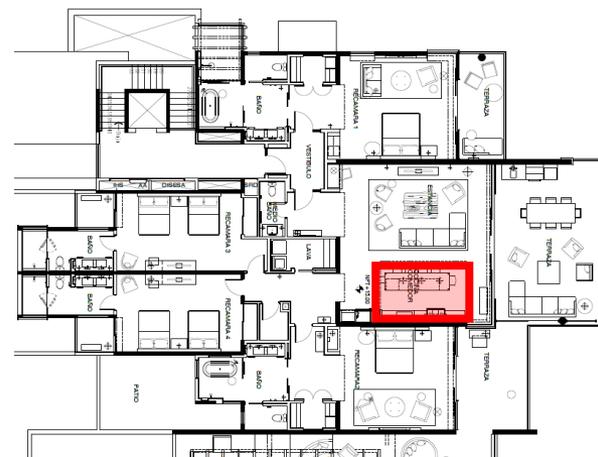

Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

15/08/22 - 21/08/22

Rec. Master: Se avanzo en el proceso de cambio de color de duelas de madera en plafón.




Remodelación "ESTRELLA 5"

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

15/08/22 - 21/08/22

Rec. 3&4: Se instalaron los pases para periscopios y se resanaron.

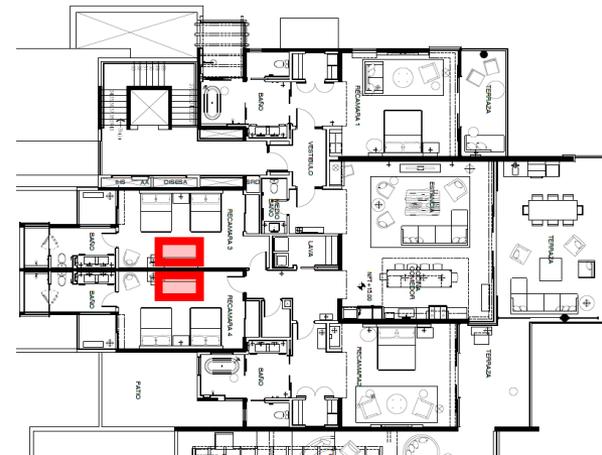


Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

22/08/22 - 27/08/22


Rec. Lock-off: Se termino limpieza fina; y la limpieza, pulido y sellado de pisos.

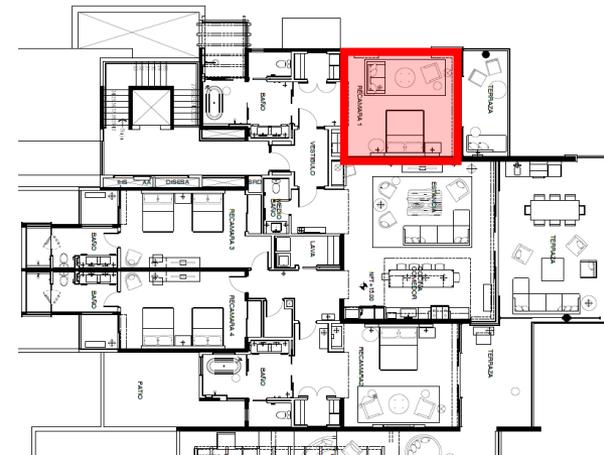

Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

Gran Salón: Se termino el proceso de pintura del plafón de duelas de madera y se empezó proceso de limpieza.

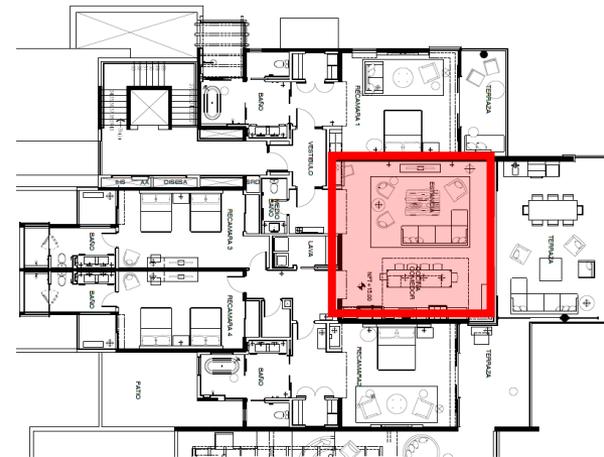

Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.


Gran Salón: Se movió base de tv, para lograr mas altura.



Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

Cocina: Se avanzo en el proceso de modificación.

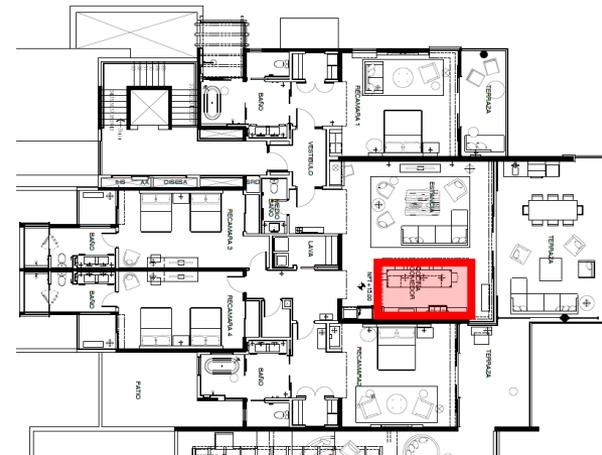

Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

Rec. Master: Se termino en el proceso de cambio de color de duelas de madera en plafón; se instalaron lámparas y abanico; y se empieza a detallar muros de paladio.



Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

Rec. Master: Se desinstalo cabecera de madera y se procedió a realizar las ranuras para la nueva ubicación de botoneras.



Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.


Rec. 3&4: Se termino de detallar muro y se instalaron las tvs.



Remodelación "ESTRELLA 5"

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

Bodega de dueños: Se desinstalaron entrepaños y se realizo ranura para nueva ubicación de contacto.



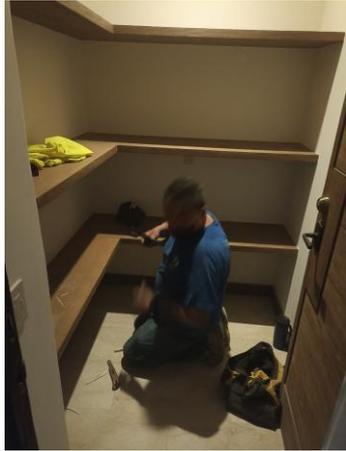


Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

05/09/22 - 10/09/22

Gran Salón y vestíbulos: Se continuo con el proceso de cambio de color de zoclos y vistas en plafón.

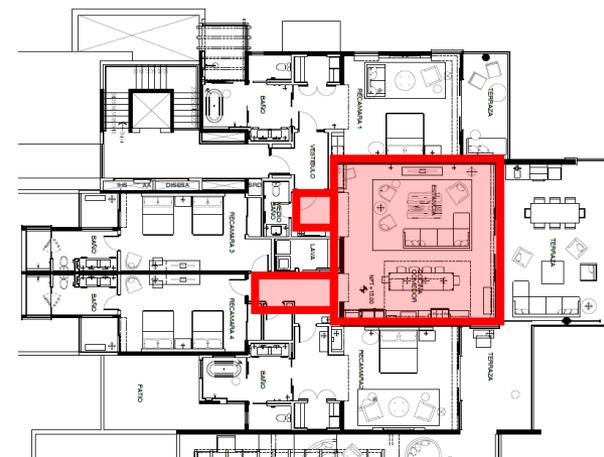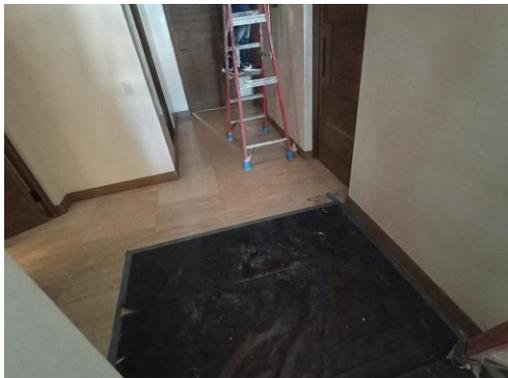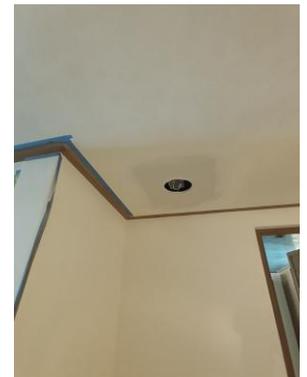

Remodelación "ESTRELLA 5"

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

05/09/22 - 10/09/22

Gran Salón: Se realizaron ranuras y se resanaron con yeso en bar seco.




Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

05/09/22 - 10/09/22

Vestíbulos Recamaras: Se realizo ranura, canalización y resane para mover termostato.

Apertura y cierre de plafón para reubicar salida de candelabro.

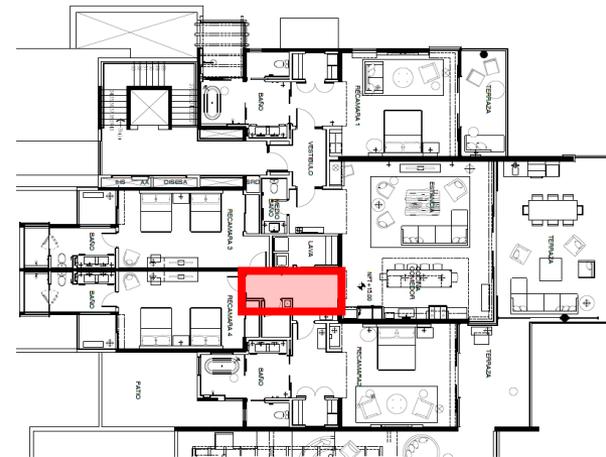


Remodelación "ESTRELLA 5"

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

05/09/22 - 10/09/22

Cocina: Se protegió cocina, se procedió a ranurar, canalizar salidas eléctricas y a resanar muro por completo.

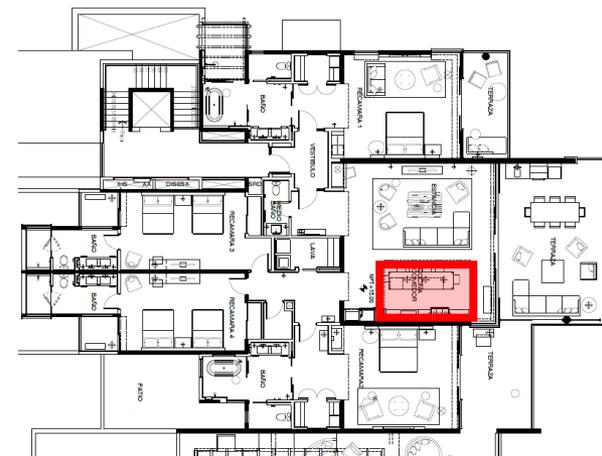

Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

05/09/22 - 10/09/22

Rec. Master: Se instaló faldón interior de madera y se empezó a detallar en cajilla para black out.





Remodelación "ESTRELLA 5"

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

05/09/22 - 10/09/22

Rec. Master: Se procedió a pintar zoclos y vistas en plafón.

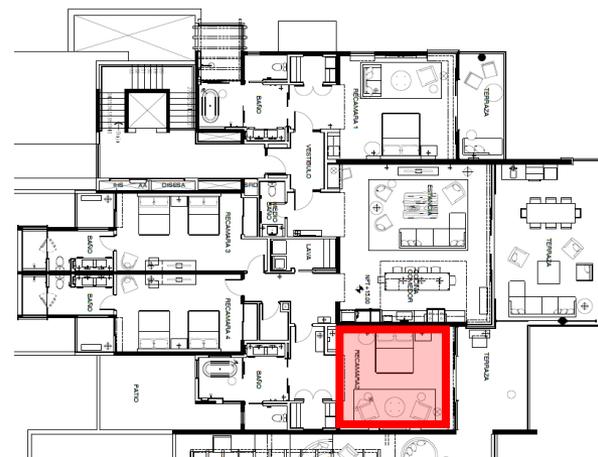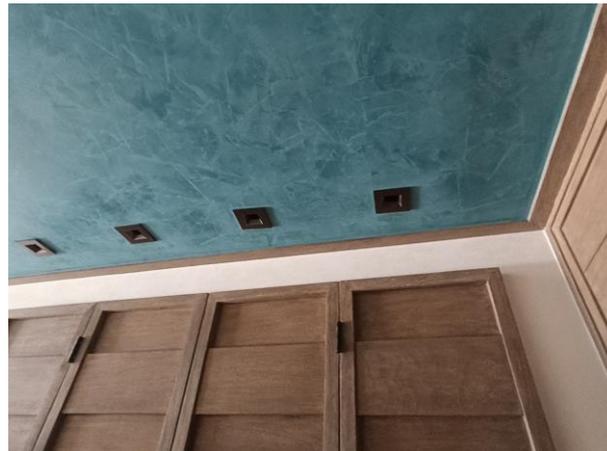

Remodelación "ESTRELLA 5"

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

05/09/22 - 10/09/22

Rec. Lock off: Se termino de pulir y detallar piso.



Remodelación "ESTRELLA 5"

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

05/09/22 - 10/09/22

Rec. Lock off: Se protegieron áreas y se empezó a deslavar color en zoclos.



Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

05/09/22 - 10/09/22

Bodega de dueños: Se realizo recorte de puerta, se instalo rejilla de ventilación ; y se empezó a detallar zoclo.



Remodelación “ESTRELLA 5”


Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

05/09/22 - 10/09/22



REAL ESTATE DEVELOPMENT

Terraza alberca: Se empezaron los trabajos de limpieza de piso.

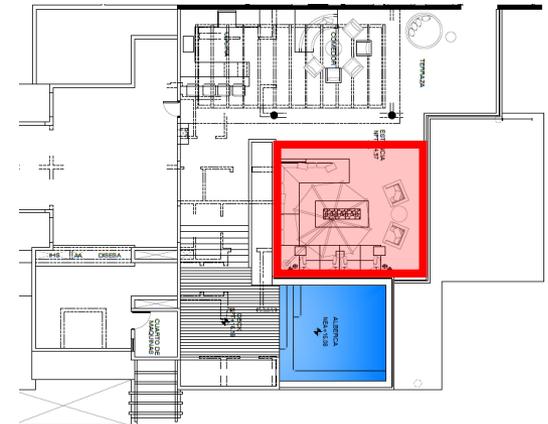


Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

05/09/22 - 10/09/22

Recamara 3 y 4: Se empezó a limpiar piso de baño y a aplicar antiderrapante en piso de regadera.

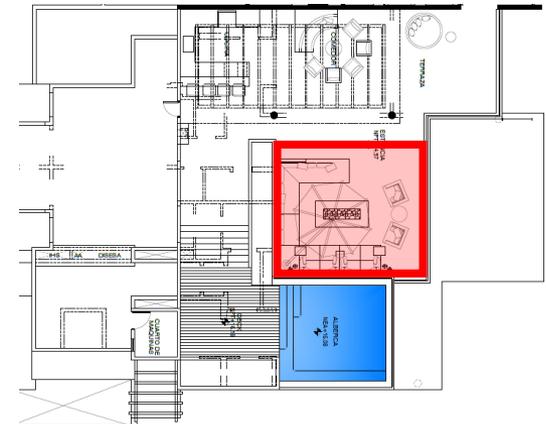


Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

12/09/22 - 15/09/22

Gran Salón y vestíbulos: Se termino con el proceso de cambio de color de zoclos y vistas en plafón.

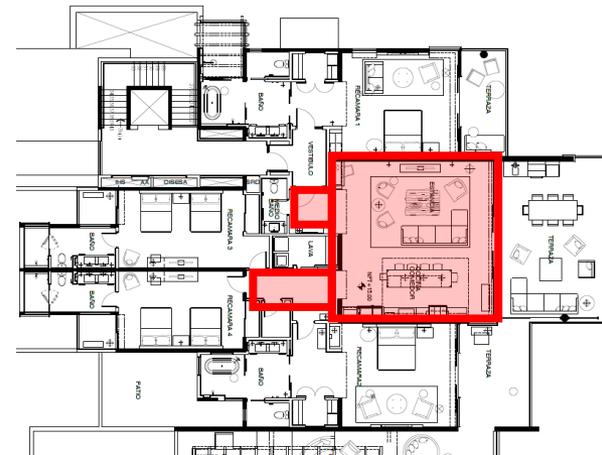

Remodelación "ESTRELLA 5"

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

12/09/22 - 15/09/22

Gran Salón: Se termino de detallar esta área.





Remodelación "ESTRELLA 5"

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

12/09/22 - 15/09/22

Vestíbulos Recamaras: Se termino el trabajo de reubicación de termostato.
Se termino la instalación de candelabro.

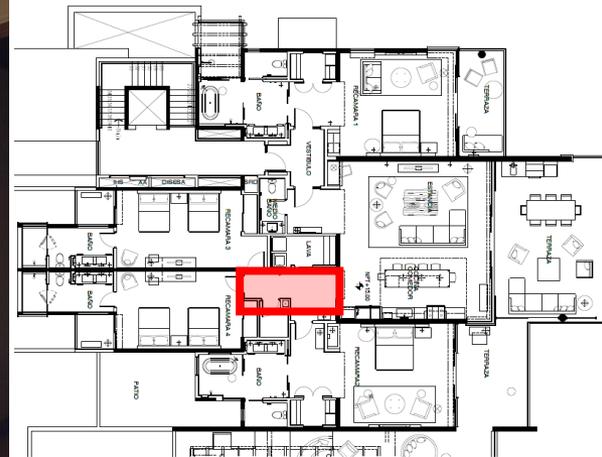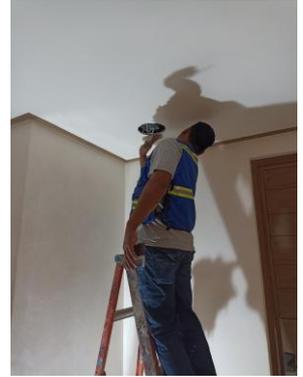

Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

12/09/22 - 15/09/22

Cocina: Se instalaron varilla que sostendrán los entrepaños.



Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

12/09/22 - 15/09/22

Rec. Master: Se finalizo la instalación de cajillos interiores.




Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

12/09/22 - 15/09/22

Rec. Master: Se termino a pintar zoclos y vistas en plafón.
-Se limpio, pulió y sello el piso.



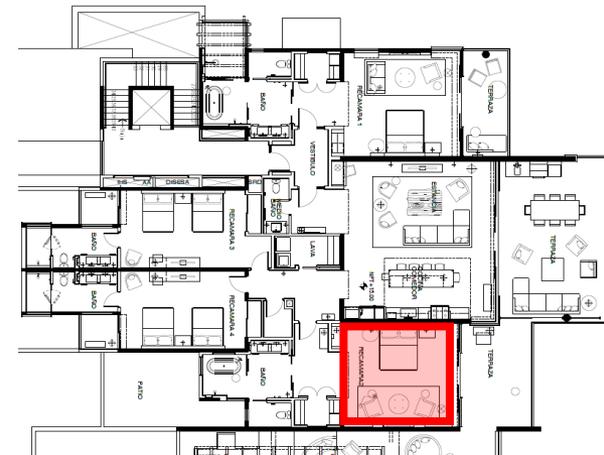


Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

12/09/22 - 15/09/22

Rec. Lock off: Se empezó a cambiar de color zoclos y vistas de madera.

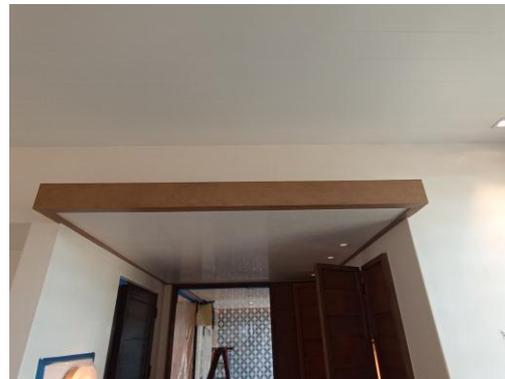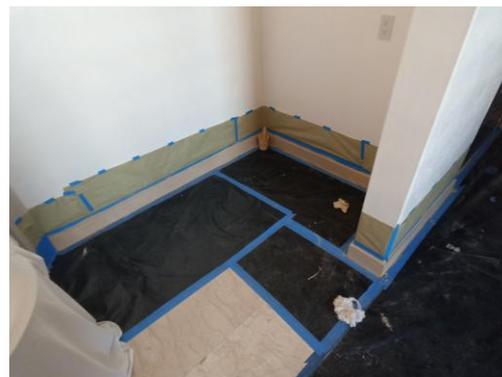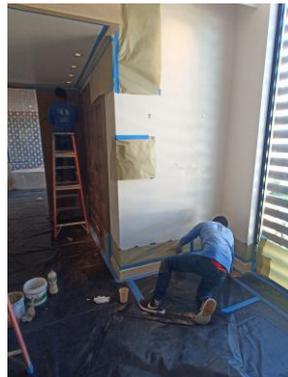


Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

12/09/22 - 15/09/22

Bodega de dueños: Se termino de detallar toda la carpintería, se instalo refrigerador y se acomodaron objetos de dueños.

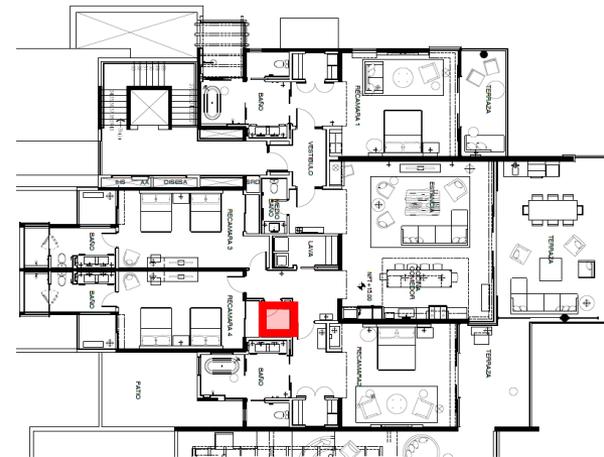

Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

12/09/22 - 15/09/22

Recamara 3 y 4: Se retiraron todos los muebles y se empezó a trabajar la limpieza y protección para cambio de color en zoclos.



Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

19/09/22 - 24/09/22

Zoclos y vistas en plafón de madera: Se finalizó el trabajo en todas las áreas.



Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

19/09/22 - 24/09/22

Lock off: Se realizaron los cambios a bar seco, ya esta en sitio. Falta espejo.




Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

19/09/22 - 24/09/22

Cocina: Fijaron accesorios eléctricos para iluminación.

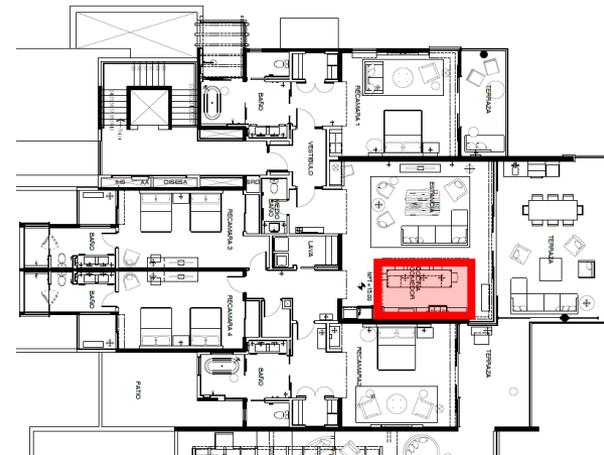


Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

19/09/22 - 24/09/22

Rec. Master: Se acomodo mobiliario.

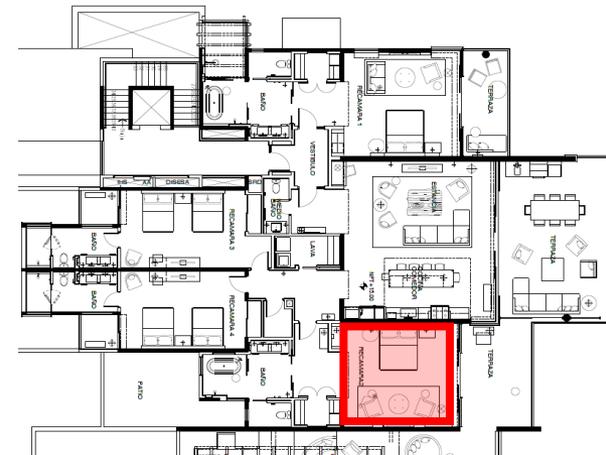

Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

19/09/22 - 24/09/22

Rec. Lock off: Se acomodo mobiliario.




Remodelación "ESTRELLA 5"

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

19/09/22 - 24/09/22

Bodega de dueños: Se acomodaron objetos de dueños.

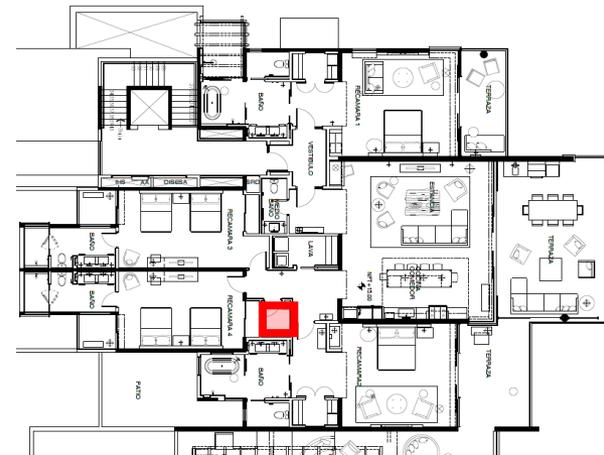


Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

19/09/22 - 24/09/22

Recamara 3: Se dejaron preparaciones eléctricas para la instalaciones de nuevas lámparas en plafón y se empezó detallar plafón.

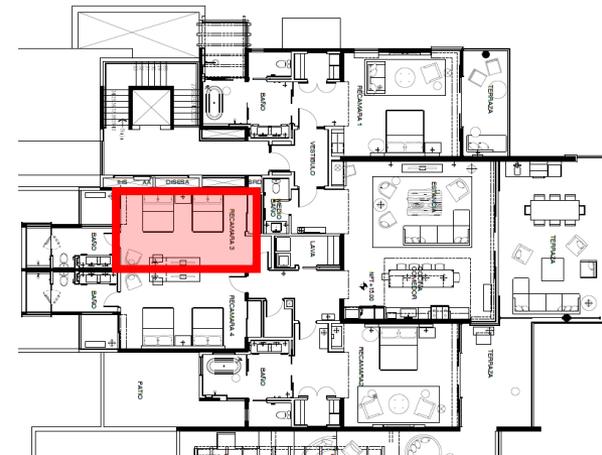


Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

19/09/22 - 24/09/22

Recamara 3: Se terminaron los trabajos de cambio de color en zoclos y se comenzó el trabajo de limpieza de piso.

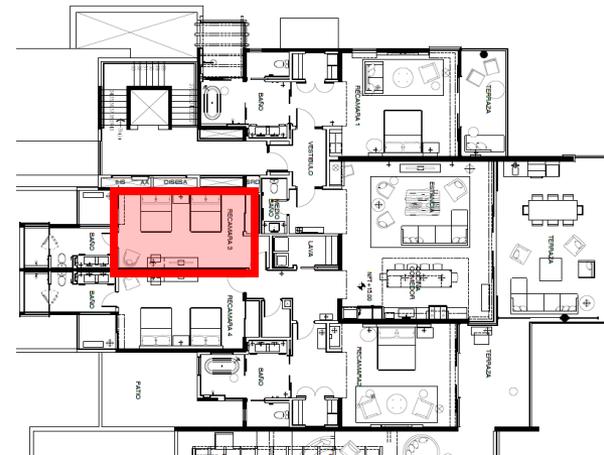


Remodelación "ESTRELLA 5"

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

26/09/22 - 01/10/22

Cocina: Se instalaron por ultimo los dimmer para la iluminación.


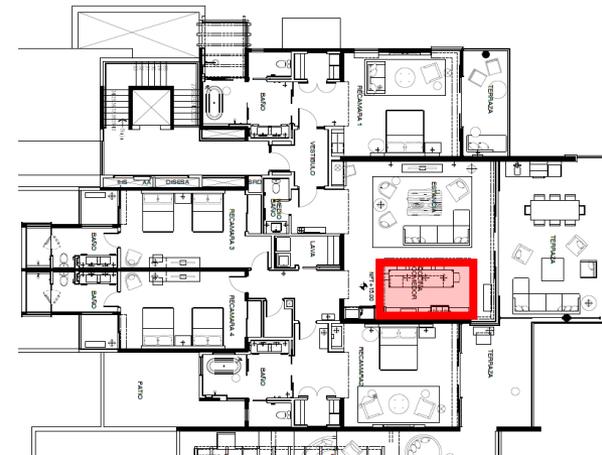


Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

26/09/22 - 01/10/22

Vestíbulo recamaras y lavandería: Se termino de limpiar, pulir y sellar piso.

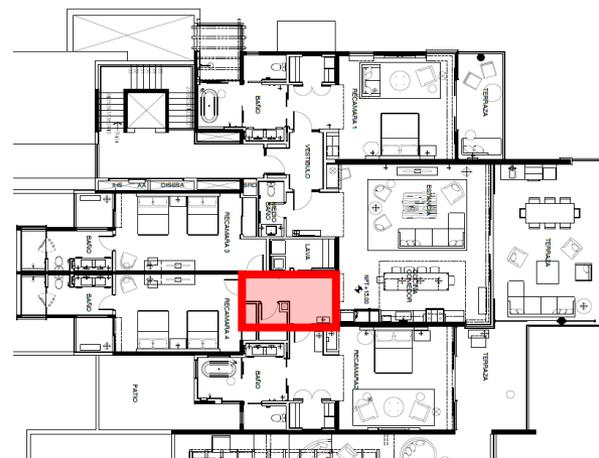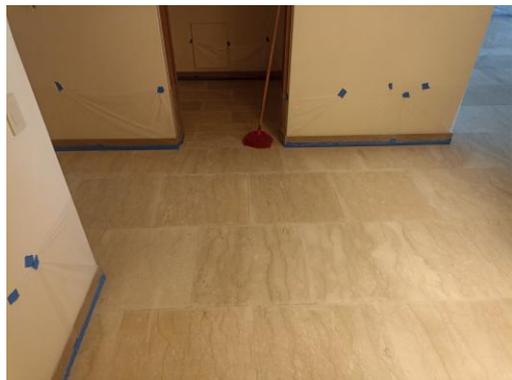


Remodelación "ESTRELLA 5"

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

26/09/22 - 01/10/22

Gran Salón: Se termino de limpiar, pulir y sellar piso; y se acomodaron los muebles.

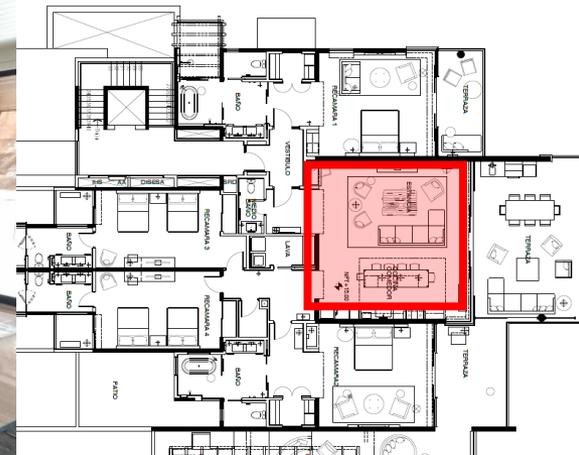


Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

26/09/22 - 01/10/22

Vestíbulo Gran Salón: Se termino de limpiar, pulir y sellar piso.

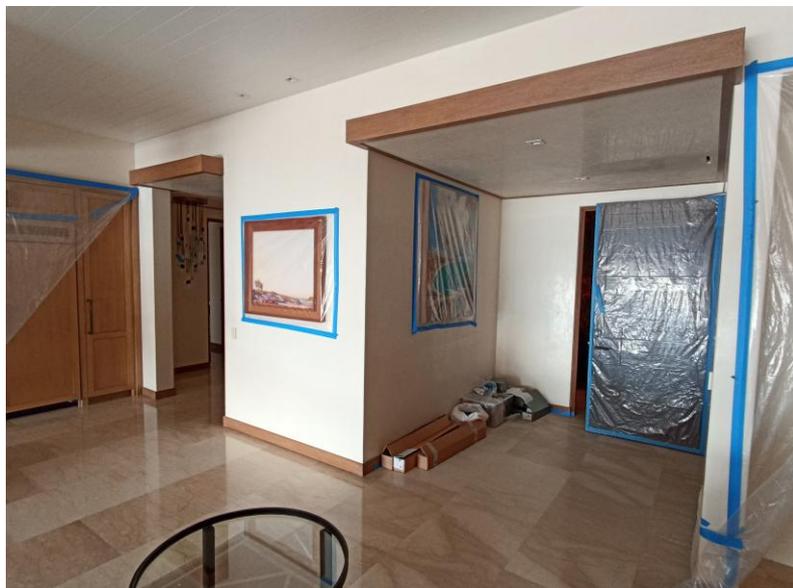

Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

26/09/22 - 01/10/22

Terrazas cubiertas: Se movieron muebles y se empezó la limpieza de piso.




Remodelación "ESTRELLA 5"

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

26/09/22 - 01/10/22

Rec. Master: Se retiraron accesorios para la instalación del papel tapiz en

WC.


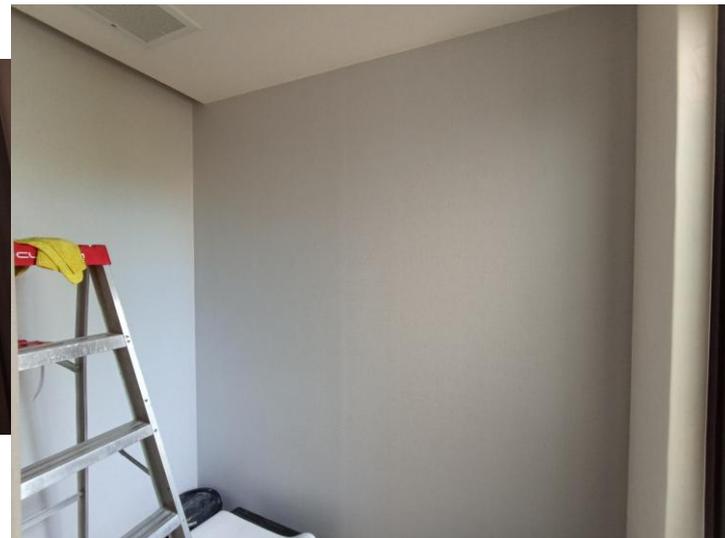


Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

26/09/22 - 01/10/22

Medio baño: Se retiraron accesorios para la instalación del papel tapiz.

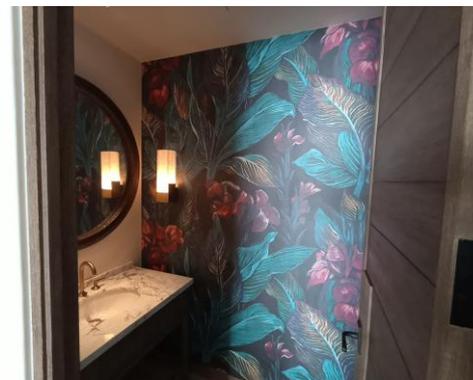
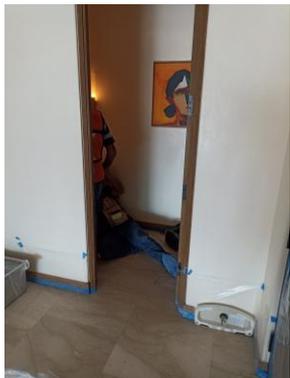


Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

26/09/22 - 01/10/22

Recamara 3: Se termino de detallar el plafón, se termino de pulir el piso y se acomodaran los muebles.

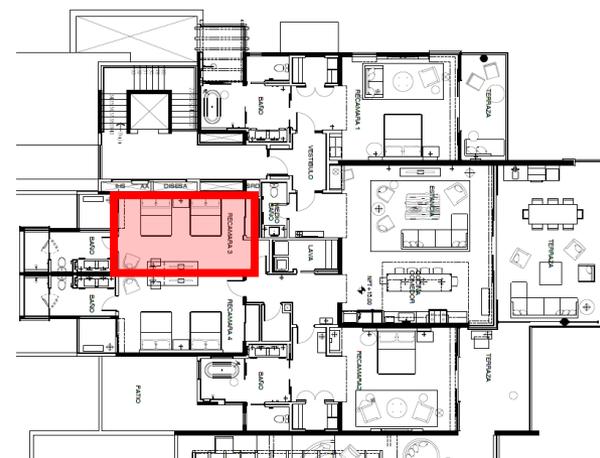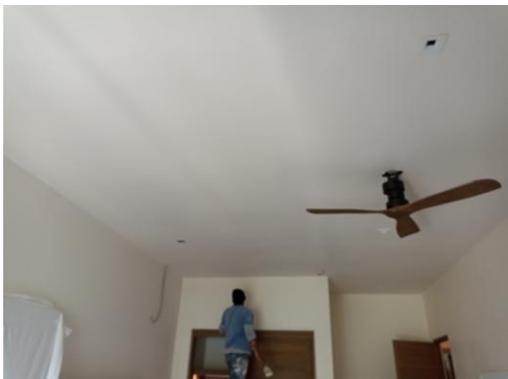

Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

03/10/22 - 08/10/22

Terrazas cubiertas: Se termino la limpieza, pulido y sellado.




Remodelación "ESTRELLA 5"

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

03/10/22 - 08/10/22

Cocina: Se realizo la instalación de acrílico luminoso y sus conexiones eléctricas.

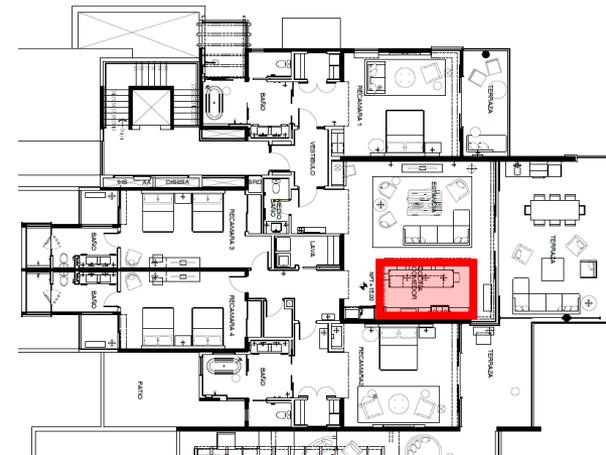

Remodelación "ESTRELLA 5"

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

03/10/22 - 08/10/22

Cocina: Se realizo la programación para después hacer funcionar la placa luminosa.




Remodelación "ESTRELLA 5"

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

03/10/22 - 08/10/22

Cocina: Se instalaron las cubiertas de cocina e isla.

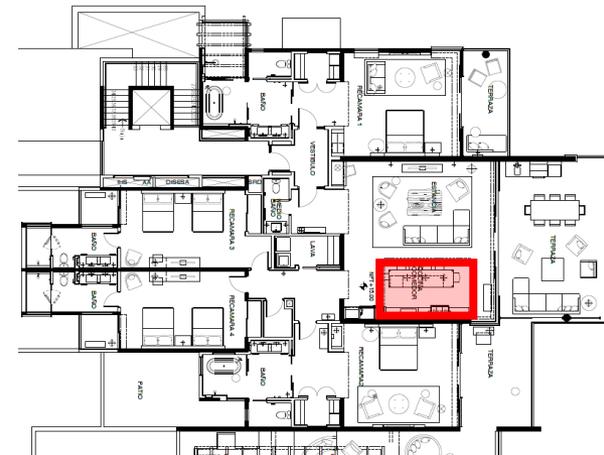


Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

03/10/22 - 08/10/22

Cocina: Se instalo backsplash de cocina.

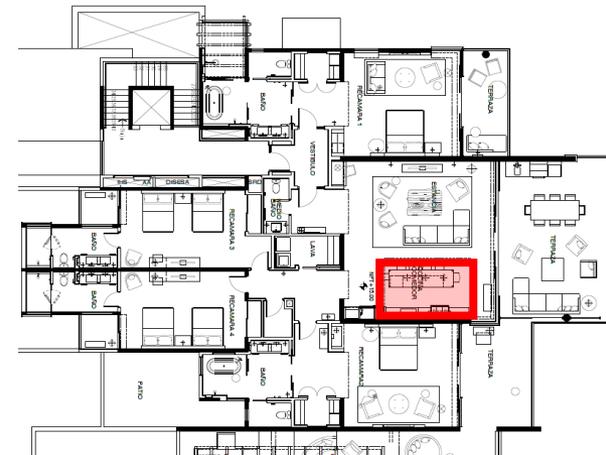


Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

03/10/22 - 08/10/22

Cocina: Se realizaron los trabajos para instalación de entrepaños.

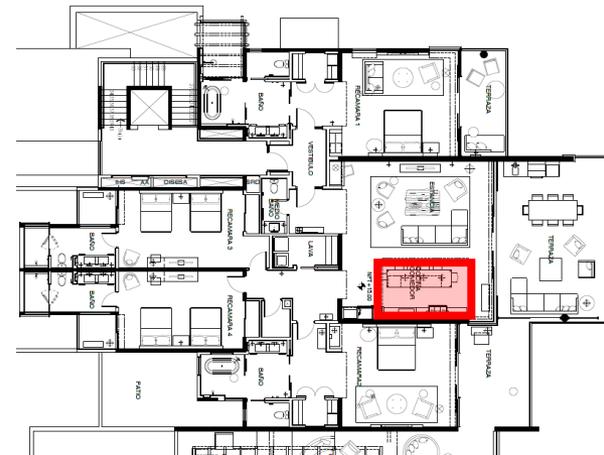


Remodelación "ESTRELLA 5"

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

03/10/22 - 08/10/22

Recamara master: Se instalo cabecera.


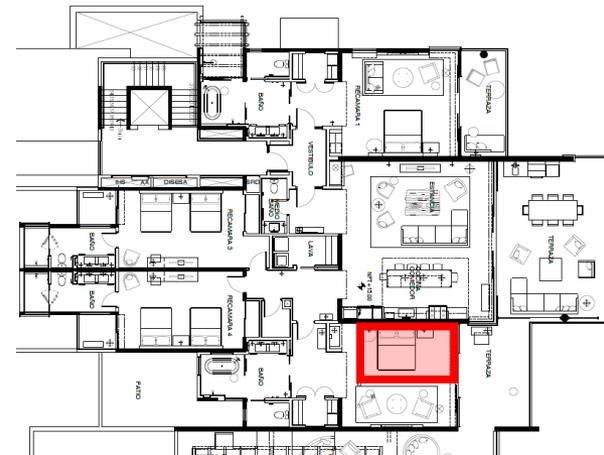


Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

26/09/22 - 01/10/22

Recamara 3: Se termino de detallar el plafón, se termino de pulir el piso y se acomodaran los muebles.

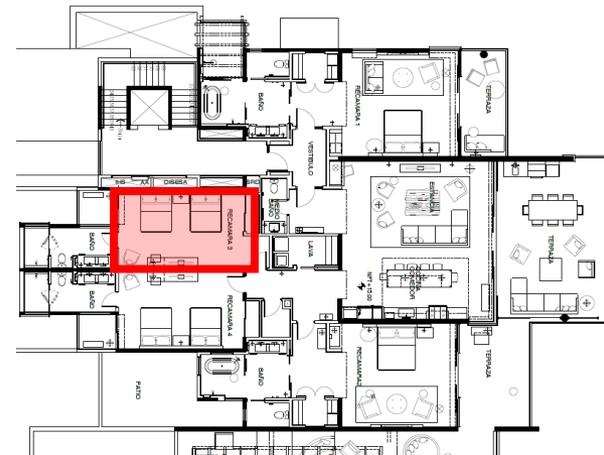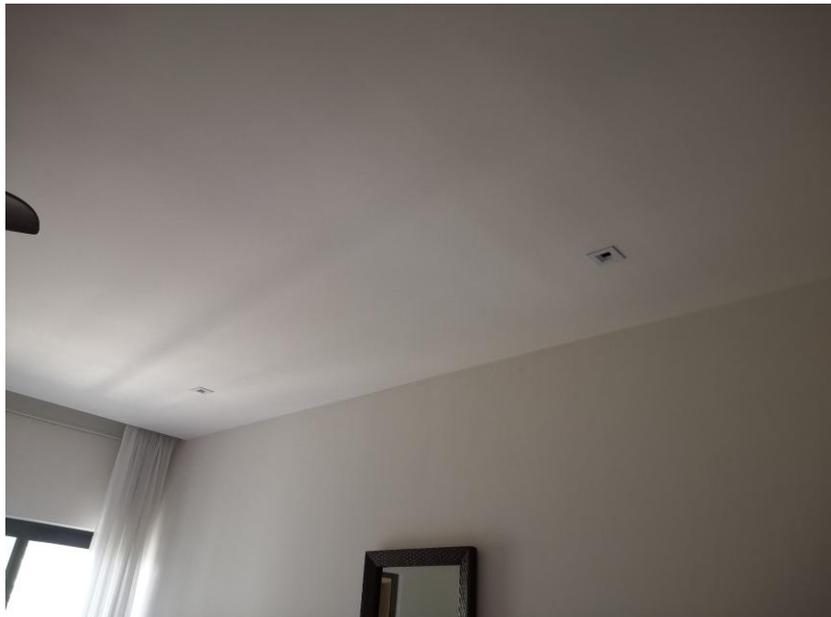


Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

03/10/22 - 08/10/22

Gran salón: Se realizo la instalación de carpintería de bar seco.

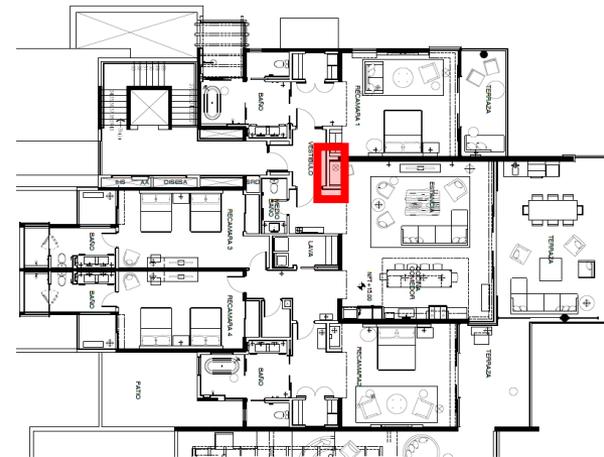


Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

10/10/22 - 16/10/22

Cocina: Se instaló la sección pendiente de backsplash; y se detalló y selló todo el granito.

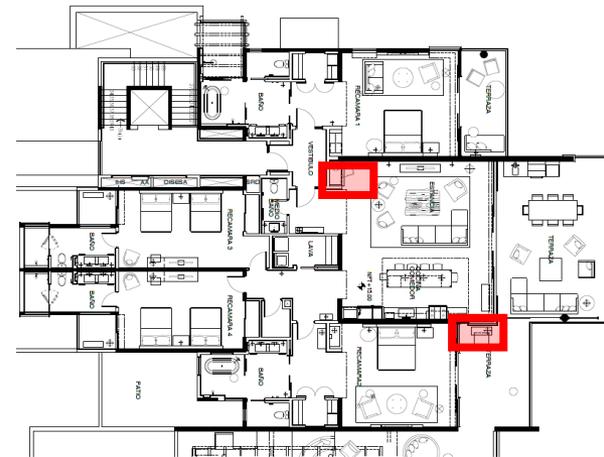


Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

10/10/22 - 16/10/22

Cocina: Se avanzaron los trabajos de detallado de cocina.

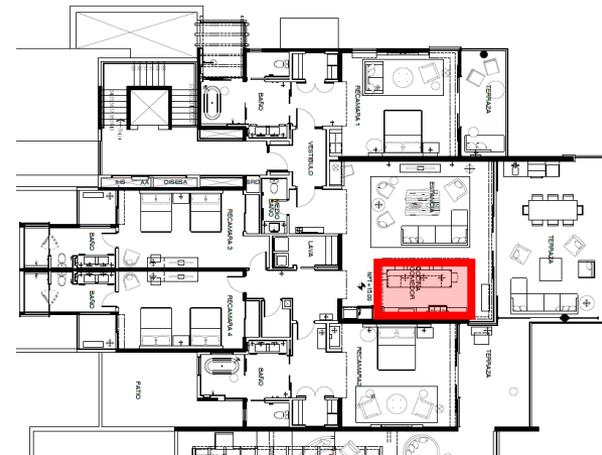


Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

10/10/22 - 16/10/22

Cocina: Se instalaron accesorios (contactos, apagadores, dimers, drivers y llave mezcladora.)

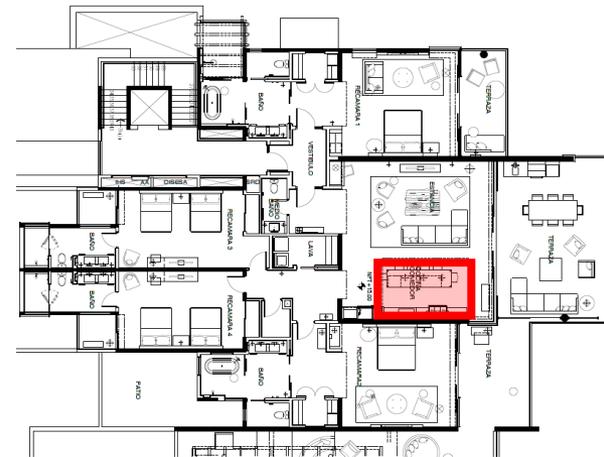


Remodelación "ESTRELLA 5"

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

10/10/22 - 16/10/22

Recamara master: Se instalo cortina black out y sus rieles.


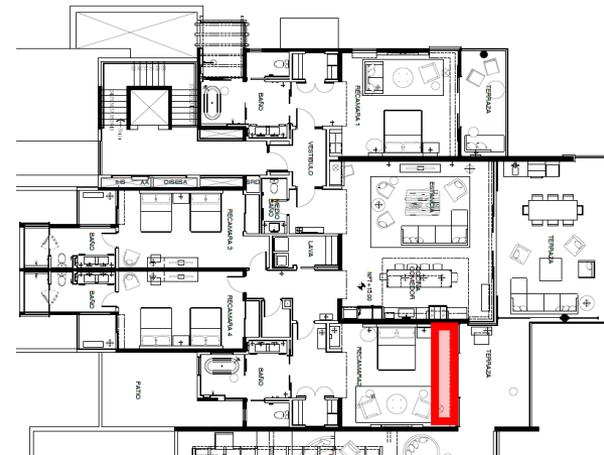


Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

10/10/22 - 16/10/22

Gran Salón: Se instalo cubierta y zoclo de bar seco; y se coloco la piedra para hacer el remate a las placas.

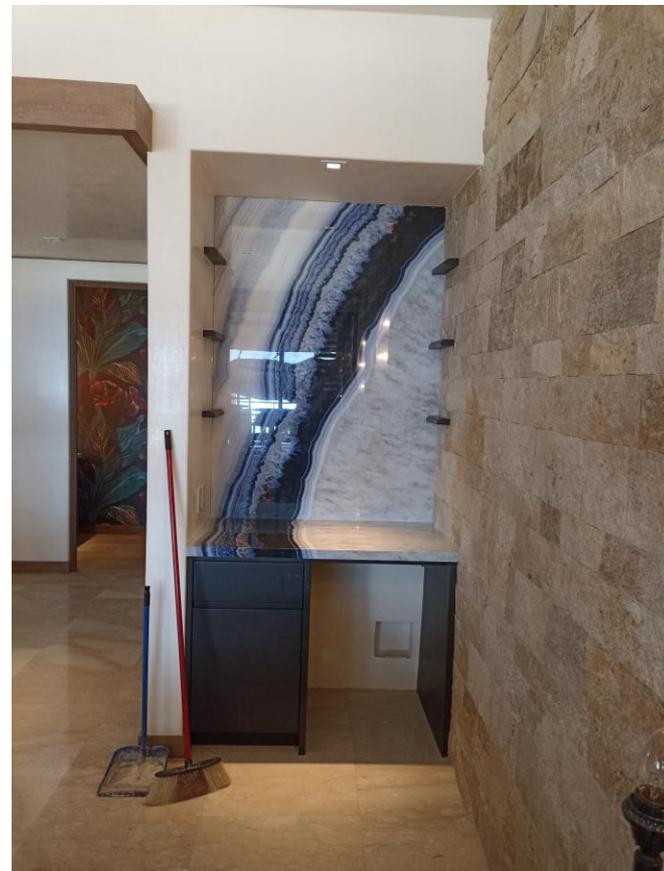
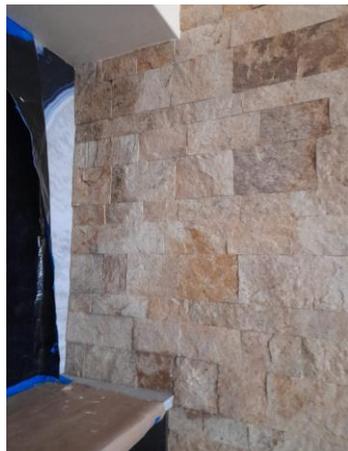


Remodelación "ESTRELLA 5"

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

10/10/22 - 16/10/22

Sanitarios rec master y lock off: Se habilitaron contactos para wc con bidet.

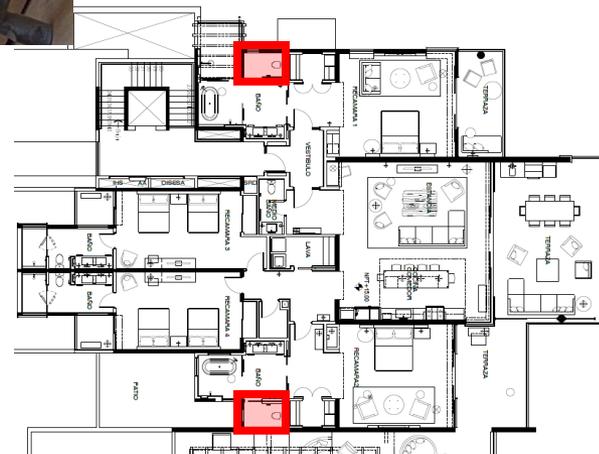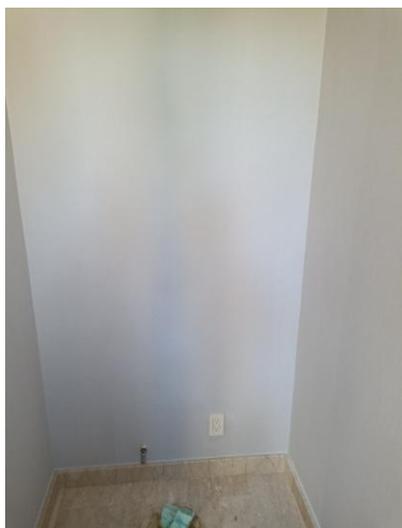

Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

10/10/22 - 16/10/22

Terraza descubierta: Se empezaron los trabajos de limpieza, y sellado de piso.



Remodelación "ESTRELLA 5"

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

17/10/22 - 22/10/22

Recamara Lock-Off: Se concluyen trabajos con la instalación de wc, cintilla luminosa a bar seco y detallado.



Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

17/10/22 - 22/10/22

Vestíbulo de acceso: Se concluyen trabajos con detallado.



Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

17/10/22 - 22/10/22

Vestíbulo gran salón: Se concluyen trabajos.



Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

17/10/22 - 22/10/22

Baño de visitas: Se concluyen trabajos.




Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

17/10/22 - 22/10/22

Cocina: Se concluyen trabajos con instalación de campana y estufa; y detallado general.

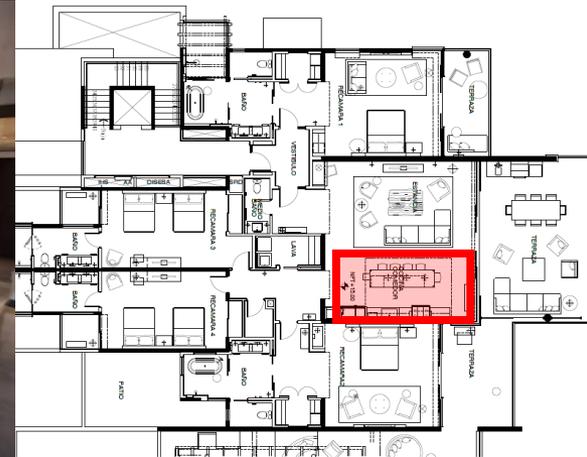


Remodelación "ESTRELLA 5"

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

17/10/22 - 22/10/22

Gran salón: Se concluyen trabajos con instalación de cava para vinos y detallado en bar seco.

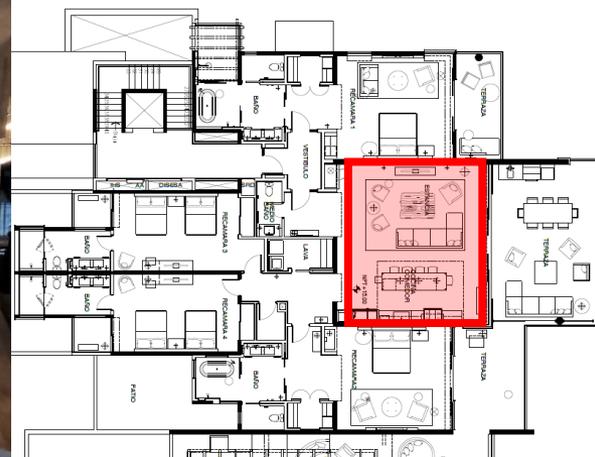

Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

17/10/22 - 22/10/22

Vestíbulo recamaras: Se concluyen trabajos con detallado.



Remodelación "ESTRELLA 5"

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

17/10/22 - 22/10/22

Recamara 3 y 4: Se concluyen trabajos con detallado e instalación de luminarias para literas (rec. 4) .




Remodelación "ESTRELLA 5"

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

17/10/22 - 22/10/22

Recamara master: Se concluyen trabajos con detallado de cortina blackout, instalación de wc y detallado.

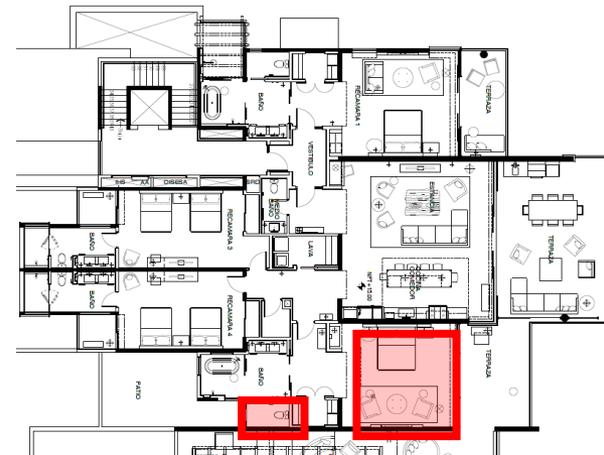

Remodelación "ESTRELLA 5"

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

17/10/22 - 22/10/22

Terrazas: Se concluyen trabajos con limpieza, detallado y sellado de piso.





Remodelación "ESTRELLA 5"

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

02/11/22 - 05/11/22

Baño Master: Retiro de espejo, desinstalación de llaves mezcladoras y lámparas arbotantes.

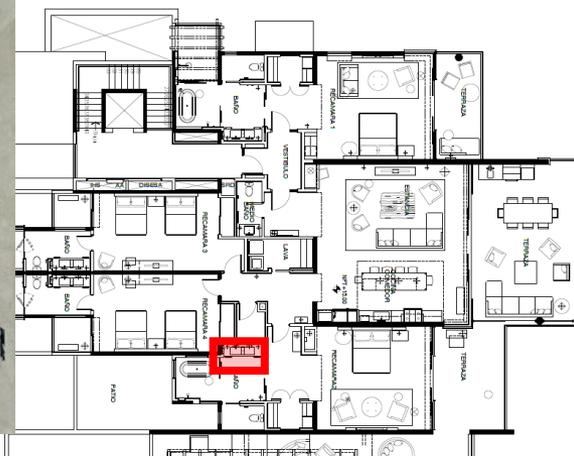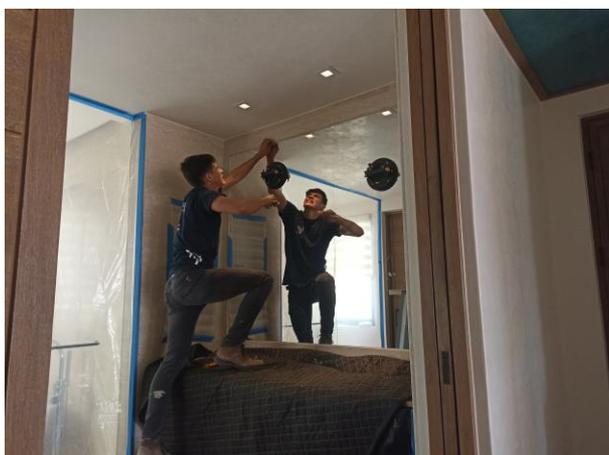


Remodelación "ESTRELLA 5"

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

02/11/22 - 05/11/22

Baño Master: Instalación y desinstalación de cintilla luminosa espejo;
instalación de espejo provisional, llaves mezcladoras y accesorios
eléctricos.


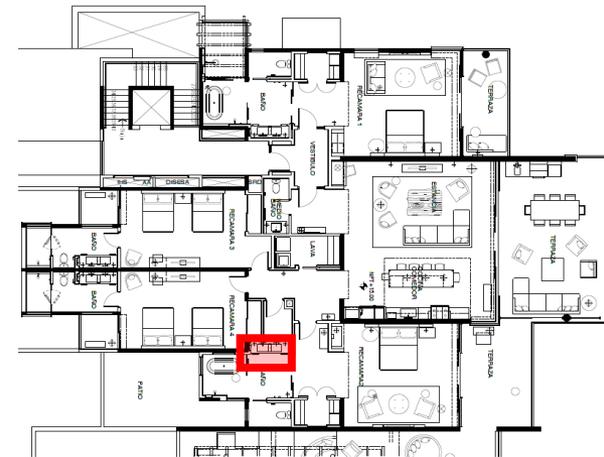


Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

02/11/22 - 05/11/22

Baño Master: Se solucionaron filtraciones de luz y se avanzo a la integración de cortina black out con sistema lutron.

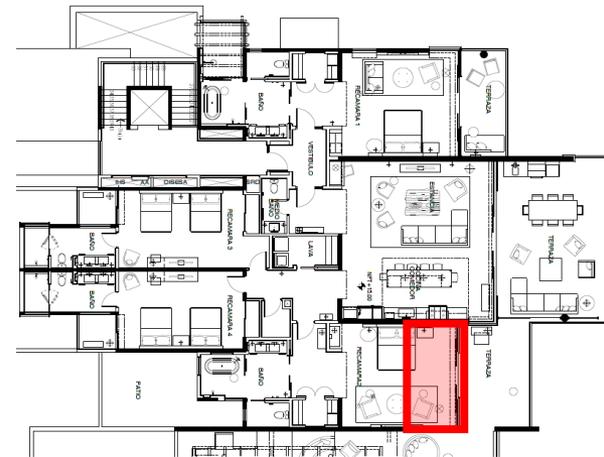

Remodelación "ESTRELLA 5"

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

02/11/22 - 05/11/22

Terraza: Retiro de celosías entre gran salón y recámara master.



Remodelación "ESTRELLA 5"

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

02/11/22 - 05/11/22

Gran salón: Se reinstalo cava y se detallo carpintería de bar seco.




Remodelación "ESTRELLA 5"

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

02/11/22 - 05/11/22

Recamara 3: Retiro cabecera y camas; se instalo y detallo litera y zoclo.


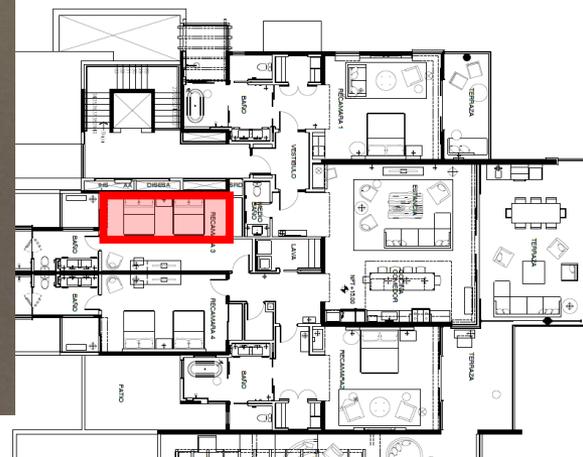


Remodelación "ESTRELLA 5"

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

02/11/22 - 05/11/22

Recamara 3: Se instalaron accesorios eléctricos botoneras, driver provisional y tapas ciegas.

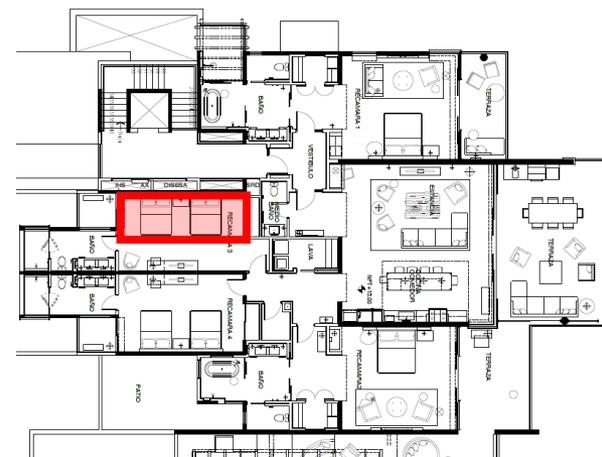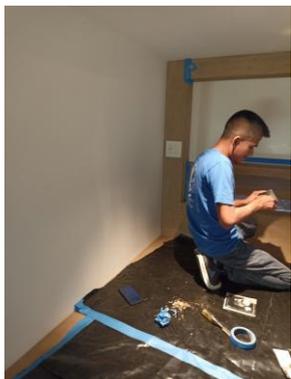


Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

02/11/22 - 05/11/22

Recamara 3: Se detallaron muros con covermix y pintura.

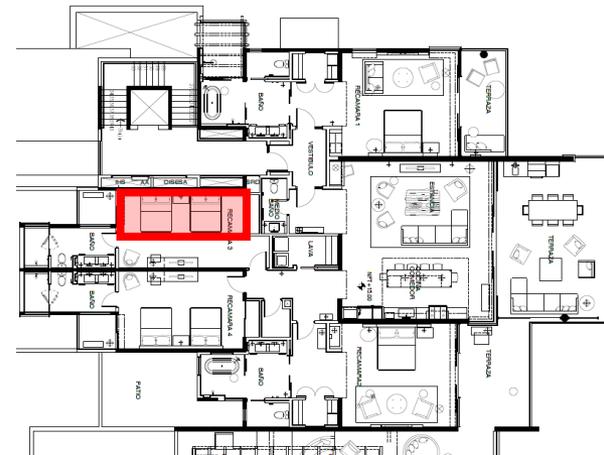


Remodelación "ESTRELLA 5"

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

28/11/22 - 03/12/22


Baño Master: Se desinstalaron e instalaron llaves mezcladoras; Se instalo cintilla luminosa en espejo; se instalo espejo.

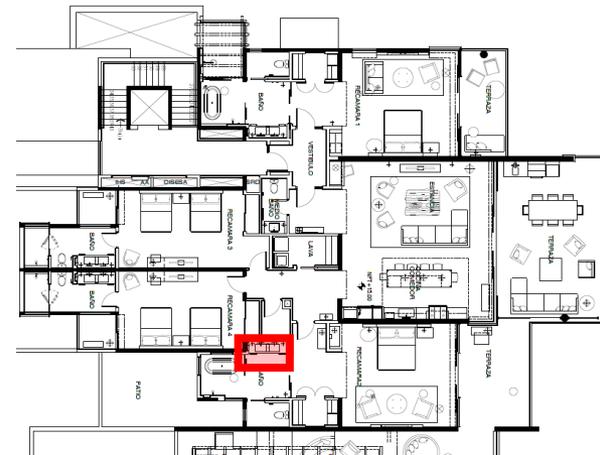

Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.


Recamara Master: Se realizo programación para que cortina funcione con botonera lutron.

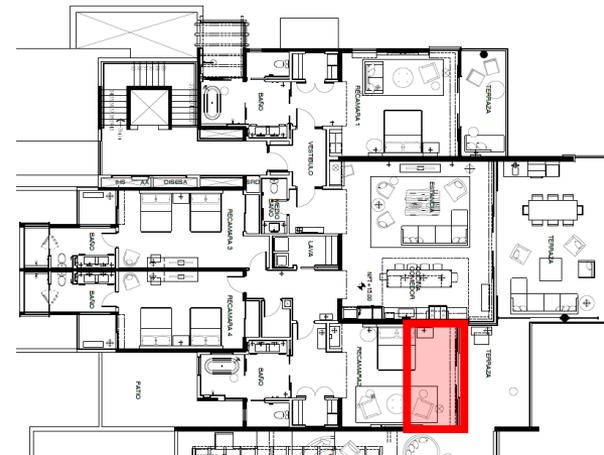

Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

Terraza: Se desinstalaron rieles y duelas; se instalaron duelas nuevas y se detallaron; se resano estuco y piso.

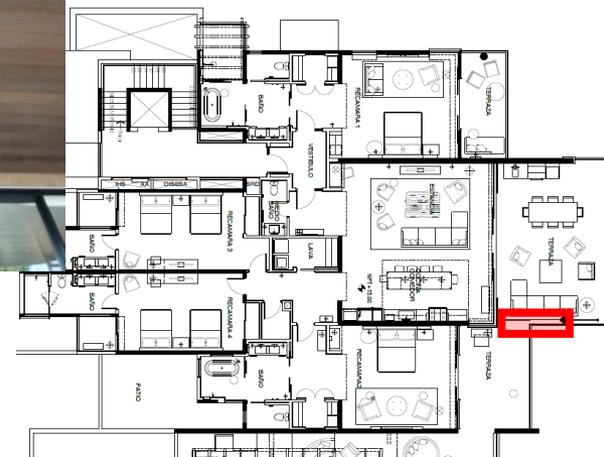

Remodelación “ESTRELLA 5”

Chileno Bay, Los Cabos, B.C.S.

Recamara 3: Se cambiaron 2 transformadores de lámparas de literas .

